



Visite de chantier à destination des commerçants Mercredi 01/12 à 9H Le rendez vous sera donné sur le parking des Halles (base vie chantier)



Si vous souhaitez participer, merci de nous confirmer votre présence à l'adresse mail suivante afin de prévoir les équipements de sécurité en conséquence :
contact-chantier-paquebot@arteliagroup.com

Les interventions en cours et à venir

Coupure rue Albert De Mun du 02/11 au 12/11

Une coupure de voirie est nécessaire pour raccorder les eaux de toiture des nouvelles passerelles au réseau d'eau pluvial présent sous la voirie. Cette coupure de voirie aura lieu du lundi 02/11 au vendredi 12/11. La durée de la coupure pourrait potentiellement être optimisée en fonction des difficultés techniques rencontrées pendant le chantier.

Le schéma de circulation sera le même que lors des précédentes coupures. Il y aura donc des déviations mises en place avec de la signalétique pour guider les automobilistes vers les commerces et les différents parkings alentours. Les panneaux d'affichage des parkings seront reprogrammés.

Les livreurs seront invités à accéder à la rue de la République à l'aide de panneaux « route barrée sauf livraisons »



Le paquebot numérique


Flash Info Travaux N° 6



Octobre 2021

L'avancement du chantier

Les travaux engagés depuis fin Février se poursuivent sur le bâtiment du Paquebot. Vous trouverez ci-dessous un aperçu de l'avancement et des prochaines étapes à venir. Le détail des interventions à venir sont présentés en seconde partie du document.

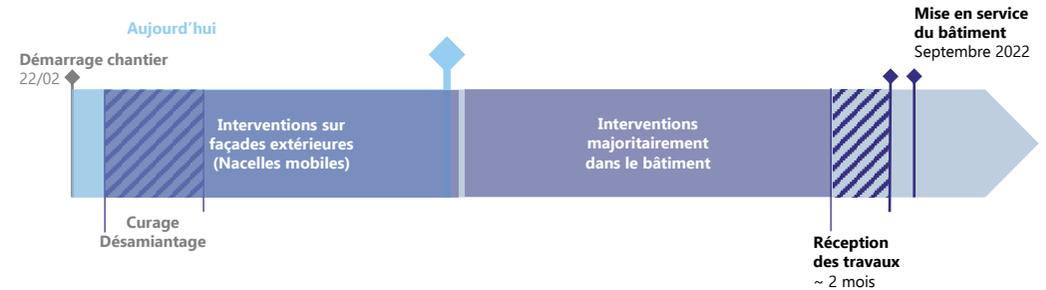

Les interventions réalisées

La dépose des échafaudages autour des nouvelles passerelles

Les échafaudages utilisés pour travailler et habiller les nouvelles passerelles ont été déposés mi Octobre. Cette dépose permet la libération du parvis en vue des animations de fin d'année au plus tard le 12 Novembre (intervention prévue début novembre détaillée ci après).

Le parvis sera réutilisé sur des périodes courtes, comme accès chantier, pour finaliser les bardages ainsi que l'entrée de l'école à compter de début 2022 et jusqu'à la fin du chantier.





www.SecondRegard.fr

Les interventions en cours et à venir

Le renouvellement de façade est en cours. Vous trouverez ci-dessous l'état d'avancement et les prochaines zones concernées.

Le renouvellement des façades du Paquebot

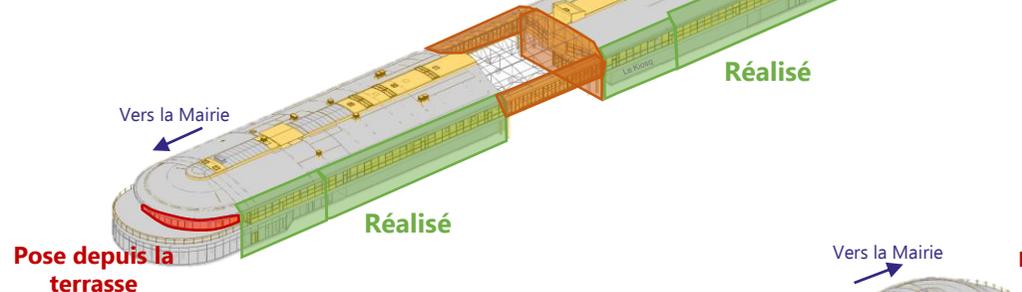

Pose depuis la terrasse

Pose depuis la terrasse

Février-Mars 2022 (à confirmer)



Photo exemple d'une nacelle mobile

Cette intervention, concernant uniquement les éléments de façade identifiés en jaune ci-dessus, sera réalisée par **nacelle mobile** depuis l'espace public. Les accès aux commerces seront maintenus, l'emprise de travail de la nacelle sera protégée. Pour les interventions qui pourraient survenir devant les accès aux commerces, les entreprises interviendront en dehors des horaires d'ouvertures.

Féeries de Noël autour du Paquebot

Illuminations

19/11/21 au 09/01/22
7H-9H/16H-23H
Nuit du 24/12 et du 31/12

Frises lumineuses entre les 76 projecteurs du paquebot
Des décorations autour des arbres du paquebot + guirlandes
Motif « les Féeries » installé au niveau du Paquebot Nord

Spectacle inaugural

Samedi 04/12/21 17H30

Départ du Ruban Bleu vers la place François Blancho en passant par le Paquebot



Mise en service des éclairages sous coursives

Les luminaires sous les coursives du paquebot seront remis en service en fin de chantier.

Dépose de la tour à matériaux nord

La tour à matériaux nord sera déposée au plus tard au 31 Décembre 2021. Les approvisionnements de chantier seront au maximum anticipés avant la dépose. Après celle-ci et pour des besoins plus ponctuels de livraison, cette ouverture de la façade sera utilisée.

Contact

Pour rappel, pour tous renseignements sur les travaux merci de vous adresser à Amélie DOSSIER et Elodie ANDRIEUX
contact-chantier-paquebot@arteliagroup.com
